

ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM -DF) PARA EL EJERCICIO 2015

EN LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ- LLAVE, SIENDO LAS 13:45 HORAS DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2015 , REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL H. CABILDO DESPUÉS DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA MODIFICACIÓN Y EL CIERRE AL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM -DF) 2015, ACUERDAN AL RESPECTO: -----

1.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA SE LLEVEN A CABO TODAS LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA ORIGINAL, CON RESPECTO A LAS DESCRIPCIONES, METAS, MONTOS, FECHAS DE INICIO Y TERMINO; COMO SE MUESTRA EN EL FORMATO-02 FISM-DF 2015 OFICIO DE MODIFICACIÓN 201530193007 (QUE CONSTA DE 02 HOJAS), Y LA INCLUSIÓN DE OBRAS NUEVAS COMO SE MUESTRA EN EL ANEXO DE APROBACIÓN -01 OFICIO No.201530193008 (QUE CONSTA DE 01 HOJA) --

2.- EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE LA OBRA 2015301930042 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRECCIONADA PARA INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESTERO, TRAMO: CALLE SIN NOMBRE - CALLE COLIMA, DE LA COLONIA CABALLERIZAS. CON UNA INVERSIÓN AUTORIZADA DE \$ 1, 924,585.80 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N), CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE MANERA BIENAL QUEDANDO LA SITUACION DE LA OBRA EN PROCESO COMO SE MUESTRA EN EL **FORMATO-04 CIERRE DE EJERCICIO FISM-DF -2015** (QUE CONSTA DE 02 HOJAS); ANEXO A ESTE DOCUMENTO Y QUE FUE FIRMADO POR LOS PRESENTES.-----

3.- DESPUES DE HABER RECIBIDO Y ANALIZADO LA SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO: EL H. CABILDO SE DA POR ENTERADO Y APRUEBA SE INFORME AL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO (ORFIS) LA RECTIFICACION DE **FECHAS DE INICIO Y TERMINO FISICO** DE LAS SIGUIENTES OBRAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN-, PARA QUE SEAN CONSIDERADAS

ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA GENERAL DE
 INVERSIÓN DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
 FEDERAL (FISM -DF) PARA EL EJERCICIO 2015

CORRECTAS DENTRO DEL TRIMESTRE QUE LE CORRESPONDEN EN EL CIERRE
 DEL EJERCICIO 2015-----

No. De Obra	DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO Y TERMINO FISICOS REALES
2015301930033	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NUEZ ENTRE LA CALLE GUAYA Y LA CALLE TARAY, TARAY ENTRE LA CALLE NUEZ Y LA CALLE TAMARINDO ENTRE LA CALLE GUAYA Y CACAO EN LA COLONIA RESERVA II.	18/09/2015 AL 01/11/2015
2015301930034	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AVE DEL PARAISO Y LAGUNA DE LAGARTOS EN LA COL. RESERVA I.	18/09/2015 AL 17/10/2015
2015301930041	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MABIRI EN LA COLONIA PLAYA LINDA	27/07/2015 AL 08/09/2015 (TRASPASO DE BURSATILIZACIÓN)

4.- SEA LLEVADO A CABO EL CAMBIO DE PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y TIPO SEGÚN CORRESPONDA DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA **CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM -DF) 2015**, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

2015301930011
 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL RECURSO FISM-DF)

APERTURA PROGRAMÁTICA	
DICE:	DEBE DECIR:
(U9)-GASTOS INDIRECTOS REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS (a)- SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMTIVA. PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(U9)-GASTOS INDIRECTOS (01)- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS (b)- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES



ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM -DF) PARA EL EJERCICIO 2015

2015301930012

SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LAS OBRAS DEL FISM-DF 2015)

APERTURA PROGRAMÁTICA	
DICE:	DEBE DECIR:
(U9)-GASTOS INDIRECTOS (01)- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS (a)- SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMITIVA. PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	(U9)-GASTOS INDIRECTOS (01)- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS (b)- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

2015301930025

INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO SECTOR 2, MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER. SUBSECTOR " B "

APERTURA PROGRAMÁTICA	
DICE:	DEBE DECIR:
(SD)-AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE) (02)- AMPLIACIÓN (b)- DRENAJE SANITARIO	(SD)-AGUA Y SANEAMIENTO (DRENAJE) (03)-CONSTRUCCIÓN (b)- DRENAJE SANITARIO

5- EL H. CABILDO Y EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL SE DAN POR ENTERADOS Y APRUEBAN EL SALDO A FAVOR DISPONIBLE DE \$ 742,830.66 (SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 66/100 M.N) DEL PROGRAMA FISM-DF 2015.

LEÍDA LA PRESENTE ACTA, ENTERÁNDOSE DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA GENERAL DE
INVERSIÓN DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISM -DF) PARA EL EJERCICIO 2015

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAMÓN POO GIL



LOS MIEMBROS DEL CABILDO MUNICIPAL

26 ENE. 2015

RECIBIDO
EXTEMPORÁNEO
La recepción de este documento no implica autorización legal alguna ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federales y estatales.
Recibió: Ing. Sironia Baitazar Martínez

SINDICO



LIC. CARLOS JOSÉ DÍAZ CORRALES

REGIDOR PRIMERO

ARQ. PABLO ZURITA GARCÍA

REGIDORA SEGUNDA

LIC. ÁNGELA MARÍA PERERA
GUTIÉRREZ

REGIDOR TERCERO

LIC. ÁNGEL FERNANDO
MALDONADO RODRÍGUEZ

ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA GENERAL DE
INVERSIÓN DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISM -DF) PARA EL EJERCICIO 2015

REGIDORA CUARTA

[Signature]

MTRA. LAURA DEL CARMEN
GÁLVEZ MANTILLA

REGIDOR QUINTO

[Signature]

ING. VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ
BRETÓN




REGIDOR SEXTO

LIC. JOSÉ RICARDO MEDINA
HERNÁNDEZ

REGIDORA SÉPTIMA

LIC. YADIRA CARRILLO MARÍN

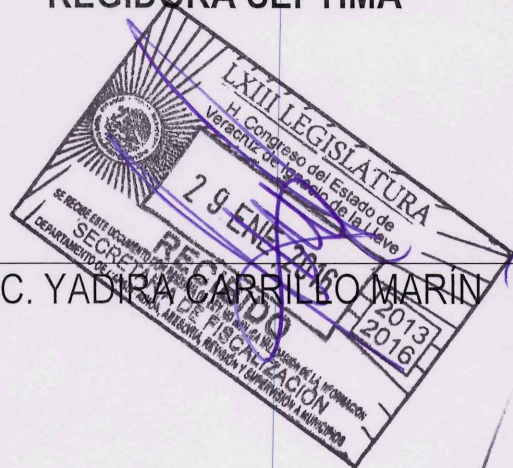

REGIDOR OCTAVO

LIC. ALEJANDRO ALVÍZAR
GUERRERO


REGIDOR NOVENO

C. MARIO CRUZ HERRERA

ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM -DF) PARA EL EJERCICIO 2015

REGIDORA DECIMA

REGIDOR DECIMO PRIMERO



L.C. DELTA ESTELA TIBURCIO HERNÁNDEZ

LIC. JUAN GABRIEL MONTES DE OCA LÓPEZ



REGIDOR DECIMO SEGUNDO

REGIDOR DECIMO TERCERO

LIC. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ

LIC. BENJAMÍN LAUREANO GUTIÉRREZ GARCÍA

PO Rosalba Utrera

Rosa M. Salazar A

ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA GENERAL DE
INVERSIÓN DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISM -DF) PARA EL EJERCICIO 2015

ASESORES TÉCNICOS



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL



LIC. DIANA FABIOLA ALVAREZ
SALAS

L.C. JORGE BRAVO FLORES



CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA



L.E. FERMÍN ISAÍAS CABO LEYVA

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES
NAVARRO

ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA GENERAL DE
INVERSIÓN DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISM -DF) PARA EL EJERCICIO 2015

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL

C. JOSEFINA LUIS CONCHA

LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES

C. ZULEYDI VIRIDIANA RAMÍREZ BAUTISTA
COL. BÈNITO JUÀREZ

C. JOSÈ LUCIO SÀNCHEZ GUZMÀN
COL. RESERVA TARIMOYA


C. ROSA MARÌA SALAZAR ALVARADO
COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

C. ALEJO MEZA ATILANO
COL. LAS BAJADAS

C. PAULA DÌAZ CRUZ
COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

C. BERNARDA VÀZQUEZ RODRIGUEZ
COL. RESERVA TARIMOYA II

C. MARIA ISABEL ORTÌZ RODRÌGUEZ
COL. AGUSTIN ACOSTA LAGUNES



ACTA DE MODIFICACIÓN Y CIERRE AL PROGRAMA GENERAL DE
INVERSIÓN DE OBRAS CON FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISM -DF) PARA EL EJERCICIO 2015


C. RODRIGO REYES CASTRO
COL. BUENA VISTA

C. JOSÉ COLORADO GARCÍA
LOCALIDAD LAS AMAPOLAS

C. GASPAR MORALES ARANZABAL
COL. PUENTE MORENO

C. ROSALBA MARTÍNEZ VARILLA
COL. DOS CAMINOS

C. FORTINO ROJAS GOMEZ
COL. LA POCHOTA





FINANCIERA
RECIBIDO
Sistema de Cuentas Corrientes
#0 2001-2004
No. de Cuentas del 30000
ENE. 2016

FORMATO 04

Hoja: # de #

1 de 2

21/01/2016

Programa		Subprograma		Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones
Tipo				Físico		Financiero		●								Recibo										Ing													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas			
SD	03																																METRO LINEAL	2,037.00	2,037.00				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS EN LA COLONIA LOS SAUCES.	30193000	VERACRUZ	100.00	27/08/2015 08/12/2015	100.00	10/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,148,386.40	3,074,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,074,193.20	6,148,386.40	3,074,193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,500.00				
SD	03																																TANQUE	1.00	1.00				
2015	30	b	CONSTRUCCION DE CARGAMO PARA DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS LOS PREDIOS	30193000	VERACRUZ	100.00	07/08/2015 31/12/2015	100.00	04/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	24,697,723.98	12,348,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348,861.98	24,697,723.98	12,348,861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12,000.00			
SD	03																																METRO LINEAL	2,614.00	2,614.00				
2015	30	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (LINEA A PRESION) DEL CARGAMO "SECTOR LOMA-PREDIOS" A LA AMPLIACION DE LA PTM DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS.	30193000	VERACRUZ	100.00	08/10/2015 30/12/2015	100.00	08/10/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,267,739.65	3,133,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133,869.83	6,267,739.65	3,133,869.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	12,000.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,592.00	1,592.20				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA SAN FRANCISCO	30193000	VERACRUZ	100.00	21/09/2015 15/12/2015	100.00	17/09/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	4,255,153.39	1,702,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,061.36	4,255,153.39	1,702,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,500.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,144.80	1,144.80				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERITAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A"	30193000	VERACRUZ	100.00	13/07/2015 21/09/2015	100.00	24/07/2015 24/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	2,508,715.18	1,254,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,357.59	2,508,715.18	1,254,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,289.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,179.20	1,179.20				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERITAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "B"	30193000	VERACRUZ	100.00	24/07/2015 01/10/2015	100.00	24/07/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	3,461,660.38	1,730,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,830.19	3,461,660.38	1,730,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,358.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,861.04	1,861.04				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERITAS (SECTOR SUR), SUBSECTOR "A"	30193000	VERACRUZ	100.00	15/07/2015 12/10/2015	100.00	28/07/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,055,239.96	3,027,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,619.98	6,055,239.96	3,027,619.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,722.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,916.96	1,916.96				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERITAS (SECTOR SUR), SUBSECTOR "B"	30193000	VERACRUZ	100.00	31/08/2015 01/11/2015	100.00	26/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,480,442.45	2,740,221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,221.22	5,480,442.45	2,740,221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,633.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,442.18	1,442.18				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 1	30193000	VERACRUZ	100.00	12/08/2015 10/10/2015	100.00	12/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	4,667,199.91	2,333,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333,599.96	4,667,199.91	2,333,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,884.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,761.29	1,761.29				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 2	30193000	VERACRUZ	100.00	12/08/2015 09/11/2015	100.00	12/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,746,800.18	2,873,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,400.09	5,746,800.18	2,873,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,522.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,419.53	1,419.53				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA, SECTOR 3	30193000	VERACRUZ	100.00	10/08/2015 02/10/2015	100.00	29/07/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	4,407,467.86	2,203,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,733.93	4,407,467.86	2,203,733.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,639.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,434.45	1,434.45				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS EN LA COLONIA OTRA MARA TRAYEVO DE LA COLONIA LA LAGUNA, SECTOR 1	30193000	VERACRUZ	100.00	21/09/2015 22/12/2015	100.00	21/09/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,152,504.94	2,576,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576,252.47	5,152,504.94	2,576,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,668.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,477.55	1,477.55				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LAGUNA, SECTOR 2	30193000	VERACRUZ	100.00	12/08/2015 10/10/2015	100.00	12/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,423,539.96	3,211,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,769.98	6,423,539.96	3,211,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,955.00			
SD	03																																METRO LINEAL	792.13	792.13				
2015	30	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS PREDIOS-LOMA, SECTOR 1	30193000	VERACRUZ	100.00	26/08/2015 26/12/2015	100.00	26/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,268,391.74	3,134,195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134,195.87	6,268,391.74	3,134,195.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,584.00			
SD	03																																METRO LINEAL	815.92	815.92				
2015	30	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS PREDIOS-LOMA, SECTOR 2	30193000	VERACRUZ	100.00	22/10/2015 31/12/2015	100.00	22/10/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,259,729.42	2,629,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,864.71	5,259,729.42	2,629,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,632.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,409.80	1,409.80				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO SECTOR 2, MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER, SUBSECTOR "A"	30193000	VERACRUZ	100.00	28/08/2015 05/11/2015	100.00	25/08/2015 11/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,579,964.47	2,789,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789,982.24	5,579,964.47	2,789,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,819.00			
SD	03																																METRO LINEAL	1,452.00	1,452.00				
2015	30	b	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO SECTOR 2, MUNICIPIO DE VERACRUZ, VER, SUBSECTOR "B"	30193000	VERACRUZ	100.00	12/10/2015 14/12/2015	100.00	02/10/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,815,166.50	2,907,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907,583.25	5,815,166.50	2,907,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,904.00			
SD	03																																METRO LINEAL	750.00	750.00				
2015	30	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EMISOR), LOMBARDO TOLEDANO, 1A. ETAPA	30193000	VERACRUZ	100.00	27/10/2015 31/12/2015	100.00	27/10/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,462,804.96	5,462,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462,804.96	5,462,804.96	5,462,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,500.00			
SD	03																																METRO LINEAL	750.00	750.00				
2015	30	b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EMISOR), LOMBARDO TOLEDANO, 2A. ETAPA	30193000	VERACRUZ	100.00	01/11/2015 22/12/2015	100.00	27/10/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	6,854,428.17	6,854,428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,85																				

SELLO DIGITAL: DovJrjbuto6n11MV1p2LUzygnR3M3uYz7V6zGPh0kgoUTWZ4Jc6fAvAhC5GfC4eQ3oXOIR18BpJtMfZvW7CnDsU08M22Id48PfQq+/fk6w7eQnB8QuuMeoMsCfk5Jx3ha5bQqV1CCiX88qTWw753mT9CeF+W/bp2Ue4nIdK0=

1MV1p2LuzynM3u8YzV6zGPhC
H AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 2017



Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz
193 VERACRUZ
FISMDF
104,687,344.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2015

FORMATO 04

Hoja: # de #

2 de 2

Fecha de Aprobación:

21/01/2016

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Estructura Financiera (Saldo)										Metas			Observaciones
Tipo		Subprograma		Físico		Financiero																																			
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales Inicio Término	%	Fechas reales Inicio Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas				
2015-30-193-0033	03	RUED Y LA CALLE TAMARINDO ENTRE LA CALLE GUAY Y CACAO EN LA COLONIA RESERVA II.	30193000	VERACRUZ	100.00	18/09/2015 07/11/2015	100.00	30/12/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	358,747.05	358,747.05								358,747.05	358,747.05							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,700.00				
2015-30-193-0034	03	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AVE DEL PARQUE Y LAGUNA DE JACARITOS EN LA COL. RESERVA I.	30193000	VERACRUZ	100.00	18/09/2015 17/10/2015	100.00	31/12/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	173,294.64	173,294.64								173,294.64	173,294.64							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,500.00				
2015-30-193-0042	02	PERFORACION HORIZONTAL DIRECCIONADA PARA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESTERO. TRAMO CALLE SIN NOMBRE - CALLE COLIMA DE LA COLONIA CABALLERIZAS.	30193000	VERACRUZ	0.00	29/12/2015	0.00		EN PROCESO	CONTRATO	1,924,585.80	1,924,585.80								0.00	0.00						1,924,585.80	1,924,585.80			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,290.00			
2015-30-193-0041	03	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE MARI EN LA COLONIA PLAYA LINDA	30193000	VERACRUZ	100.00	27/07/2015 08/09/2015	100.00	27/10/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,453,497.10	5,453,497.10								5,453,497.10	5,453,497.10							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00		
2015-30-193-0032	02	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA VERACRUZ-MEDULLIN, COLONIA GRANJAS ROTICARIA, COLONIA ALFREDO BONILL, COLONIA LOS RIOS, Y COLONIA PUENTE MORENO.	30193000	VERACRUZ	100.00	06/07/2015 19/08/2015	100.00	21/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	5,262,068.82	5,262,068.82								5,262,068.82	5,262,068.82							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3,000.00		
2015-30-193-0040	01	REHABILITACION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARRIETO FLORES COLONIA LAS BAJADAS	30193006	LAS BAJADAS	100.00	12/10/2015 07/12/2015	100.00	09/10/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	1,549,935.53	1,549,935.53								1,549,935.53	1,549,935.53							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	1.00	
2015-30-193-0010	02	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA CHALCHIHUECAN	30192015	COLONIA CHALCHIHUECAN	100.00	09/09/2015 09/11/2015	100.00	04/09/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	1,589,380.90	1,589,380.90								1,589,380.90	1,589,380.90							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	3.00	
2015-30-193-0029	02	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS "ALFONSO LOPEZ MATEOS" EN LAS BAJADAS	30193009	LAS BAJADAS	100.00	08/10/2015 06/12/2015	100.00	08/10/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	399,826.18	399,826.18								399,826.18	399,826.18							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMINO	1.00	1.00	
2015-30-193-0011	01	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS (CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL ISM-DF 2015)	30193000	VERACRUZ	100.00	02/09/2015 31/12/2015	100.00	02/09/2015 31/12/2015	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,232,020.86	1,232,020.86								1,232,020.86	1,232,020.86							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00	
2015-30-193-0012	01	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS (ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LAS OBRAS DEL ISM-DF 2015)	30193000	VERACRUZ	100.00	17/08/2015 31/12/2015	100.00	17/08/2015 31/12/2015	TERMINADA	ADMINISTRACION DIRECTA	1,519,993.01	1,519,993.01								1,519,993.01	1,519,993.01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	1.00	
2015-30-193-0026	01	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO RIO MEDIO	30193009	VERACRUZ	100.00	25/07/2015 31/12/2015	100.00	24/07/2015 31/12/2015	TERMINADA	CONTRATO	41,832,021.18	41,832,021.18							23,310,489.52	41,832,021.18							23,310,489.52	41,832,021.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20,000.00	

TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO

181808470.4 103974513.3 0 0 0 2553092.03 0 75280825 179863544.6 102049927.0 0 0 0 2553092.03 0 75280825 1924585.8 1924585.8 0 0 0

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014-2017

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

José Luis Sosa Contreras
José

TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
TESORERÍA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA

RECIBIDO

26 ENE. 2016

La recepción de este documento no implica autorización legal alguna ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.

Recibió Ing. Sirenia Baltazar Martínez

CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014-2017

SELLO DIGITAL: DovJrjbut06nh1MVp2LuzynM3uBYz/v6zGPh0kgoUTWZ4Jc6AvAhC5gCF4eQ3oXOIR18BpJtMfzVW7CnDsU08M22Id48PFQq+/fk6w7eQnb8QuuMeoMscfks5Jx3ha5bQqv1CCIX88qTWw7S3mT9CeF+W/bp2Ue4nlqK0=

Última actualización: 21/01/2016
