


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FISM-DF
Presupuesto Autorizado: 104,887,344.00

Progr Subpr Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)										Metas		Observaciones
				Físico		Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas										
				Fechas reales		Fechas reales				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)						Metas										
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
SD	03	b	004	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA LOS SAUCES	301930001	VERACRUZ	65.00	27/08/2015	24.00	10/09/2015		8 305 411.24	4 152 706.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2 037.00					
2015	30	193	0004																						PERSONA	4 500.00						
SD	03	b	007	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PARA DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS LOS FREDIOS	301930001	VERACRUZ	28.30	07/08/2015	26.00	04/08/2015		27 735 973.16	13 867 586.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00					
2015	30	193	0007																						PERSONA	12 000.00						
SD	03	b	008	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (LINEA A PRESIÓN) DEL CARCAMO SECTOR LOMA PREZOSA LA AMPLIACIÓN DE LA (PTAR) DE LOMAS DEL COYOL-PALMAS	301930001	VERACRUZ	0.00		0.00			3 143 177.27	1 571 588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2 514.00					
2015	30	193	0008																						PERSONA	12 000.00						
SD	03	b	009	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA SAN FRANCISCO	301930001	VERACRUZ	2.00	21/09/2015	27.00	17/09/2015		4 759 742.00	1 907 827.00	0.00	0.00	0.00	2 861 845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1 592.00					
2015	30	193	0009																						PERSONA	4 500.00						
SD	02	s	010	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA CHALCHIHUECAN	301930151	COLONIA CHALCHIHUECAN	16.57	09/09/2015	30.00	04/09/2015		1 600 000.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00					
2015	30	193	0010																							ALUMNO	300.00					
US	01	a	011	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL RECURSO FISM-DF)	301930001	VERACRUZ	46.60	02/09/2015	47.00	02/09/2015		600 000.00	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00					
2015	30	193	0011																							PERSONA	12 000.00					
US	01	a	012	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA LAS OBRAS DEL FISM-DF 2015)	301930001	VERACRUZ	25.33	17/08/2015	26.00	17/08/2015		1 800 000.00	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00					
2015	30	193	0012																							PERSONA	12 000.00					
SD	03	b	013	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERIZAS (SECTOR NORTE) SUBSECTOR "A"	301930001	VERACRUZ	100.00	13/07/2015	21/09/2015	27.00	24/07/2015		4 580 000.00	2 450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1 144.80					
2015	30	193	0013																							PERSONA	2 289.00					
SD	03	b	014	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERIZAS (SECTOR NORTE) SUBSECTOR "B"	301930001	VERACRUZ	58.00	24/07/2015	27.00	24/07/2015		5 129 570.50	2 564 785.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1 175.20					
2015	30	193	0014																							PERSONA	2 358.00					
SD	03	b	015	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERIZAS (SECTOR SUR) SUBSECTOR "A"	301930001	VERACRUZ	90.00	15/07/2015	56.00	28/07/2015		6 807 144.03	3 403 572.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1 861.04					
2015	30	193	0015																							PERSONA	3 722.00					
SD	03	b	016	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS CABALLERIZAS (SECTOR SUR) SUBSECTOR "B"	301930001	VERACRUZ	51.30	31/08/2015	24.00	26/08/2015		7 011 662.36	3 506 831.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1 915.96					
2015	30	193	0016																							PERSONA	3 833.00					
SD	03	b	017	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LA LOMA SECTOR 1	301930001	VERACRUZ	75.00	12/08/2015	27.00	12/08/2015		5 185 420.00	2 592 710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1 442.16					
2015	30	193	0017																							PERSONA	2 884.80					
SD	03	b	018	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA SECTOR 2	301930001	VERACRUZ	65.00	12/08/2015	27.00	12/08/2015		6 332 753.00	3 156 361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1 751.29					
2015	30	193	0018																							PERSONA	3 522.00					
SD	03	b	019	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS EN LA COLONIA LA LOMA SECTOR 3	301930001	VERACRUZ	49.00	10/08/2015	26.00	26/07/2015		5 103 975.68	2 551 987.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1 415.53					
2015	30	193	0019																							PERSONA	2 836.00					



La recepción de este documento no implica autorización legal alguna ni válida o legítima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se notifica con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la fiscalización superior de los órdenes federal y estatal.
Recibió: Ing. Sirovia Baltazar Martínez
C. JOSEFINA LUIS CONCHA
Vocal de Control y Vigilancia del C.D.M.

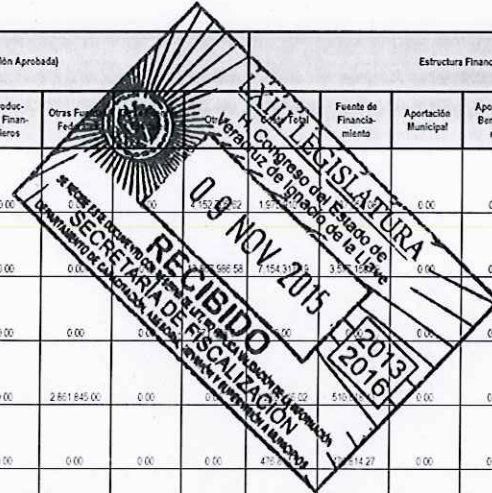

VERACRUZ

H. AYUNTAMIENTO DE CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REGISTRO TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2015
TERCER TRIMESTRE
Periodo: Del 1o. De Julio al 30 de Septiembre

FORMATO 03

Clave y Nombre de la Entidad:

30

Veracruz

Clave y Nombre del Municipio:

193

VERACRUZ

Fuente de Financiamiento:


FISM-DF

Presupuesto Autorizado:

104,087,344.00

Hoja
Fecha de Aprobación2 de 3
30/09/2015

Programa Subproyecto Tipo Línea	No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra				Clave de Localidad				Localidad				Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)												Metas		Observaciones
																	Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)												Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)														
																	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas											
																		Inicio	Termino		Inicio	Termino																													
SD	03	b	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA DORA MARIA TREVINO Y DE LA COLONIA LA LAGUNA, SECTOR 1	301930001	VERACRUZ	0.50	21/09/2015	25/09/2015	25.00	21/09/2015	6,301,798.92	3,150,899.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,899.46	1,545,751.48	772,875.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,875.74	METRO LINEAL	1,434.45																							
2015	30	193	0021																								PERSONA	2,868.00																							
SD	03	b	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES VARIAS EN LA COLONIA DORA MARIA TREVINO Y DE LA COLONIA LA LAGUNA, SECTOR 2	301930001	VERACRUZ	45.00	12/08/2015	30/08/2015	30.00	12/08/2015	6,451,134.34	3,245,567.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245,567.17	1,927,061.99	963,530.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,530.99	METRO LINEAL	1,477.55																							
2015	30	193	0021																								PERSONA	2,955.00																							
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS PREDIOS-LOMA, SECTOR 1	301930001	VERACRUZ	11.00	25/08/2015	31/08/2015	31.00	25/08/2015	5,014,193.13	2,507,096.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,096.56	1,567,097.53	783,548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,548.96	METRO LINEAL	792.13																							
2015	30	193	0022																								PERSONA	1,584.00																							
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LAS COLONIAS PREDIOS-LOMA, SECTOR 2	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00		5,164,842.86	2,582,421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,421.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	615.92																						
2015	30	193	0023																								PERSONA	1,632.00																							
SD	03	b	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO SECTOR 2 MUNICIPIO DE VERACRUZ VER. SUBSECTOR "A"	301930001	VERACRUZ	60.00	25/08/2015	65/08/2015	65.00	25/08/2015	5,659,748.58	2,829,874.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829,874.29	3,704,311.42	1,852,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,155.68	METRO LINEAL	1,419.80																							
2015	30	193	0024																								PERSONA	2,819.00																							
SD	02	b	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO SECTOR 2 MUNICIPIO DE VERACRUZ VER. SUBSECTOR "B"	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00		5,826,793.80	2,914,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914,896.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,452.00																						
2015	30	193	0025																								PERSONA	2,904.00																							
SD	01	a	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO RIO MEDIO	301930001	VERACRUZ	32.50	25/07/2015	49/07/2015	49.00	24/07/2015	54,109,813.91	18,538,434.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,171,379.04	26,248,457.10	9,186,573.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,061,523.13	PERSONA	20,000.00																							
2015	30	193	0026																									PLANTA	1.00																						
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (EMSOR) LOMBARDO TOLEDANO 1A ETAPA	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00		5,397,622.27	4,698,831.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	750.00																						
2015	30	193	0027																								PERSONA	0.00																							
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (EMSOR) LOMBARDO TOLEDANO 2A ETAPA	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00		5,397,622.26	4,698,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698,831.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	750.00																						
2015	30	193	0028																								PERSONA	1,500.00																							
SJ	02	a	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA CHALCHUECAN	301930001	LAS BAJADAS	0.00			0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00																						
2015	30	193	0029																									ALUMNO	250.00																						
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CARRETERA VERACRUZ-MEDULLIN COLONIA GRAN LAS BOTICARIAS, COLONIA ALFREDO BOYFIL, COLONIA LOS RIOS Y COLONIA PUENTE MORENO	301930001	VERACRUZ	100.00	06/07/2015	20/08/2015	20.00	21/08/2015	6,142,015.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,620.59	1,578,620.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	11,167.30																						
2015	30	193	0030																								PERSONA	3,000.00																							
PP	01		PREVENCIÓN PRESUPUESTARIA	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	GASTO	1.00																						
2015	30	193	0031																								PERSONA	10,000.00																							
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NUEZ ENTRE LA CALLE QUAYA Y LA CALLE TARAY TARAY ENTRE LA CALLE NUEZ Y LA CALLE TAMARINDO ENTRE LA CALLE QUAYA Y CAZCO EN LA COLONIA RESERVA II	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00		358,747.05	358,747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	215.20																						
2015	30	193	0033																								PERSONA	2,700.00																							
SD	03	b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE AVE DEL PARAISO Y LAGUNA DE LAS ARTES EN LA COL. RESERVA I	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	81.00																						
2015	30	193	0034																								PERSONA	1,500.00																							

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTOPRESIDENCIA
MUNICIPALL. RAMON P. GIL
PRESIDENTE MUNICIPALL.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPALCONTRALORIA
MUNICIPALH. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017L.E. FERMIN ISMAEL CABO LEYVA
CONTRALOR MUNICIPALC. JOSEFINA LUIS CONCHA
Vocal de Control y Vigilancia del C.D.M.

Última actualización 22/10/2015

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FISM-DF
Presupuesto Autorizado: 104,687,344.00

Hoja 3 de 3
Fecha de Aprobación 30/09/2015

Progra ma	Subpr ogramas	Tipo de Obra	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Fisico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
							Físico		Financiero																				
							Fechas reales		Fechas reales																				
							%	Inicio	Termino	%	Inicio	Termino	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	
SJ	02	a	005	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA FAVON UBICADA EN CALLE 3 SIN ESQUINA CALLE 1 EN COL. VALENTE DIAZ	301930001	VERACRUZ	0.00					450 000.00	450 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00				
SE	02	b	006	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZAPOTE ENTRE URSULO GALVAN Y GRANO DE ORO EN LA COLONIA RESERVA DE TARIMOVIA II	301930001	VERACRUZ	100.00	27/08/2015	25/09/2015	0.00		950 000.00	950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1 662.00				
SJ	02	a	007	CONSTRUCCION DE AULAS Y CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS "MARGARITA MORAN VELIZ" UBICADO EN AV. ANTORCHA ENTRE JORGE OBISPO Y LIBERTAD, COLONIA RESERVA IV	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00		1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00				
SJ	02	a	008	CONSTRUCCION DE AULAS Y CUBIERTA EN PRIMARIA "LUIS CORDOBA REYES" UBICADO EN AV. ANTORCHA ENTRE JORGE OBISPO Y LIBERTAD, COLONIA RESERVA IV	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00		850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00				
SJ	02	m	009	CONSTRUCCION DE AULAS Y CUBIERTA EN TELESECUNDARIA "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" UBICADA EN AV. ANTORCHA ENTRE JORGE OBISPO Y LIBERTAD, COLONIA RESERVA IV	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00		850 000.00	850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00				
SJ	01	c	010	REHABILITACION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES COLONIA LAS BAJADAS	301930001	LAS BAJADAS	0.00			0.00		1 550 000.00	1 550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
																								ALUMNO	5 000.00				

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
C. RAMON FOCIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. JORGE BRAVO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2014 - 2017

L.E. FERMIN ISAIAS CABO LEYVA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSEFINA LUIS CONCHA
Vocat de Control y Vigilancia del C.D.M

DIRECCION DE SEGUIMIENTO
A PLANES Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO
RECIBIDO
- 6 NOV. 2015
La recepción de este documento no implica autorización legal alguna, ni valida o legitima cualquier tipo de revisión y, por tanto, se recibe con las reservas de ley aplicables al régimen jurídico de la Organización superior de los órdenes federal y estatal.
Recibido: Ing. Sirocin Baltazar Martinez
