



**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
No. DE OBRA: 2015301930013
(CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO)**

Convenio Modificatorio al Contrato No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Veracruz, representado por el C. RAMON POO GIL, Presidente Municipal Constitucional; el Síndico Único, C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES y el Director De Obras Publicas C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO y por la otra PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA, S.A. DE C.V. representada por el ING. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS, mismos a quien en lo sucesivo se les denominará "El Municipio" y "El Contratista" respectivamente de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas.

ANTECEDENTES

I.- Las partes de este convenio, celebraron con fecha 18 DE JUNIO DE 2015 Contrato de Obra Pública el cual se denominó: **INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE) , SUBSECTOR " A " , UBICADO EN LA COLONIA CABALLERIZAS**, otorgado por MODALIDAD DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

II.- El objeto del contrato aludido en el inciso inmediato anterior, fue **INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR " A " , UBICADO EN LA COLONIA CABALLERIZAS**.

III.- El importe del contrato original fue por la cantidad de \$ 4'533,988.93 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.) incluido el IVA., para ser ejecutado en un término de 60 D.C. que iniciaría el 19 DE JUNIO DE 2015 y concluiría en fecha 17 DE AGOSTO DEL 2015.

IV.- En razón de que la obra materia del contrato aludido en el antecedente I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas** por las causas que a continuación se enumeran de manera limitativa:

DECLARACIONES

- 1.1.- "EL MUNICIPIO" está facultado para suscribir el presente Contrato de conformidad con lo establecido en los **Artículos 115** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **68 y 71** de la Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, **2 y 35** fracciones II y XXV de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado Libre y Soberano de Veracruz - Llave.
- 1.2.- "EL C. RAMON POO GIL, acredita su personalidad como Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con la Constancia de Mayoría de la Elección de Presidente Municipal emitida el 09 de Julio de 2013 por el Consejo Municipal de Veracruz, Veracruz, del Instituto Electoral Veracruzano, la Gaceta Oficial del Estado el día viernes tres de Enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, asimismo, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con la fracción VI del artículo 36 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
No. DE OBRA: 2015301930013**

- 1.3. "Que el **C.CARLOS JOSE DIAZ CORRALES**, acredita su personalidad y facultades como **Síndico del Ayuntamiento de Veracruz, Ver.**, de conformidad con la constancia de mayoría de fecha 09 de julio de 2013, signado por el Presidente del Consejo Municipal Electoral, Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano, Acuerdo del Consejo Estatal Electoral publicado en la Gaceta Oficial del estado, el día viernes tres de enero de 2014, bajo el número extraordinario 006, que contiene la relación de los integrantes de los Ayuntamiento en el proceso electoral 2013, así como el acta número uno de la Sesión Ordinaria de Instalación del Ayuntamiento Municipal Constitucional de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, de fecha primero de enero de 2014, así mismo se encuentra facultado de conformidad con la fracción II, del artículo 37 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en vigor, para la celebración del presente contrato."
- 1.4.- El **C. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO**, acredita su personalidad como Director de Obras Públicas del Municipio de Veracruz, Ver., de conformidad con el nombramiento de fecha 01 de Enero de 2014, signado por el **C. RAMON POO GIL**, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz con fecha de 1 enero del año 2014.
- 1.5.- Para el cumplimiento de las funciones a su cargo y la realización de sus actividades, requiere de la ejecución de obra pública consistente en **INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR " A "**, en términos de la normatividad aplicable. En razón de lo anterior, suscribe el presente convenio modificatorio para el efecto de **ANTECEDENTE I de este instrumento, requiere que se desplace su fecha de inicio y conforme a lo que establece el Artículo 50 FRACCION I de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.**
- 1.6.- En atención a lo anterior, celebra el presente convenio modificatorio de **TIEMPO** al contrato de obra pública a precios unitarios, con **"EL CONTRATISTA"**, con fundamento en el **Artículo 50 FRACCION I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.**
- 1.7.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con la asignación de Partida Presupuestal correspondiente, con cargo a del Municipio de Veracruz.
- 1.8.- Su domicilio para los efectos del presente Contrato será el Palacio Municipal de Veracruz, Veracruz, sito en la Avenida Zaragoza s/n, esquina Lerdo, Col. Centro de esta ciudad de Veracruz.
- 2.- **"EL CONTRATISTA" BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DECLARA QUE:**
- 2.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente Contrato.

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

**CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
No. DE OBRA: 2015301930013**

- 2.2.- La empresa contratista denominada **PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA, S.A. DE C.V.** acredita su legal existencia con **ACTA CONSTITUTIVA No. 19903** de fecha **21 de MAYO de 2010** otorgada por **LIC. JAVIER HERRERA CANTILLO, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 27**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER.**, inscrita en el registro público de la propiedad con No. de folio **2168*2** de fecha **28 de JULIO de 2010**, R.F.C. **PCA100521M35** y Registro del IMSS **F3021903106**.
- 2.3.- El **ING. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS** acredita su personalidad como **Representante Legal** de **PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA, S.A. DE C.V.** con el testimonio de **ESCRITURA PUBLICA No.19903** de fecha **21 de MAYO de 2010** otorgada por **LIC. JAVIER HERRERA CANTILLO, NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 27**, en la ciudad de **VERACRUZ, VER.**, y declara bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la suscripción del mismo no le ha sido revocada la misma.
- 2.4.- Tiene establecido su domicilio en **CALLE TEXCOCO No. 59, REVOLUCION, C.P. 94295** en la ciudad de **BOCA DEL RIO, VERACRUZ**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de éste Contrato.
- 2.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente Contrato.
- 2.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**; está dado de alta en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas Municipales con **registro CON-008-PCOPV-008-0114**, y en la Secretaría de Finanzas y Planeación con Registro No. **42099**.
- 2.7.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución; así como las condiciones físicas y económicas que la rodean. Que conoce cabalmente y sin ninguna duda los planos; las bases, las normas, las especificaciones y el alcance del proyecto, ratificando su acuerdo que sobre esta base documental se elaboró su presupuesto a precios unitarios, así como su programa de obra.
- 2.8.- "EL CONTRATISTA" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de nacionalidad en seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

V.- Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarse las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: De acuerdo a la cláusula tercera del contrato. Se difiere la fecha de inicio de la obra que era el día **19 DE JUNIO DE 2015**, por lo que la fecha de inicio del contrato modificado será el día **24 DE JULIO DE 2015**, para concluirse el día **21 DE SEPTIEMBRE DE 2015**.



H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
No. DE OBRA: 2015301930013

SEGUNDA: Las partes convienen **no modificar** el importe original del contrato aludido en el antecedente I, el aplazamiento en la fecha de inicio de la obra no implica variación al proyecto, ya que no se ampliaron las metas físicas iniciales, ni se afectan las condiciones a que se refieren la naturaleza y características esenciales de la obra del contrato que se modifica en este acto, razón por la que se celebra este convenio.

TERCERA: Las anteriores modificaciones al contrato original, no varían ni alteran de manera alguna las demás obligaciones pactadas; conservando estas, todo su valor y fuerza legal.

CUARTA: Las estipulaciones contenidas en el contrato original, que no fueron modificadas por efectos del presente instrumento jurídico, subsistirán en sus mismos términos, para los efectos legales a que haya lugar.

QUINTA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas**, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales con residencia en este Municipio de Veracruz, Ver.; por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiese corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa,

SEXTA: Este convenio solo obligará al Municipio de Veracruz en todo lo que no se inconformen la Tesorería Municipal y la Contraloría Municipal, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha en que tengan conocimiento, de conformidad con lo anterior expuesto en este documento.

Para constancia firman al margen y al calce, las partes el presente convenio a los **27** días del mes de **JULIO** de 2015.

POR "EL MUNICIPIO"

C. RAMON POO GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.



VERACRUZ
CIUDAD Y PUERTO



**Trabajamos
Juntos**

**H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

CONV-TIEMPO-001/15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
No. DE OBRA: 2015301930013

C. CARLOS JOSE DIAZ CORRALES
SINDICO UNICO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ.

ARQ. OSCAR SALVADOR BARBES NAVARRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"

ING. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS
REPRESENTANTE LEGAL DE
PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ING. LORENZO BAUTISTA PONCE
COORDINADOR DE PRESUPUESTOS,
LICITACIONES Y CONTRATOS.



INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VARIAS DE
LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE) SUBSECTOR "A"

CONTRATO No. DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
ASUNTO: R E P R O G R A M A C I O N

ING. JORGE TEPEPA GONZALEZ
SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E

Por este conducto me dirijo a usted para hacerle llegar la reprogramación de la obra DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15 de este municipio, concerniente a la ejecución de los trabajos: **INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE) SUBSECTOR "A"** del municipio de Veracruz Ver. En consecuencia al anticipo que esta empresa recibió por parte del H. ayuntamiento el día **24 de Julio del 2015**, y motivo por el cual se realiza un reajuste en los periodos de ejecución quedando de la siguiente manera: **24 de Julio al 21 de septiembre del 2015**

Se Adjunta a oficio, ficha de depósito, así como programa de obra actualizado. Sin más por el momento, me permito enviarle un cordial saludo quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
H. VERACRUZ, VER., A 27 DE JULIO DEL 2015

C. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS
REPRESENTANTE LEGAL
PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA, S.A. DE C.V.

CALLE TEXCOCO NO 59
COL. REVOLUCIÓN 94296
BOCA DEL RIO, VER

p.c.algarca@gmail.com

TELEFONO: 2170220
FAX 2170221

Le notificamos que se ha registrado la instrucción para realizar una Transferencia a su cuenta a través de Banorte en su Empresa, los datos de la Transferencia son los siguientes:

Operación:Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha y Hora de Operación:24/Jul/2015 14:29:14 horas

Nombre del Ordenante:MUNICIPIO DE VERACRUZ VER

RFC del Ordenante:MVV080508US0

Nombre del Beneficiario:PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA SA DE CV

CLABE Destino:*****9202

Banco destino:Scotiabank - Inverlat

RFC del Beneficiario:PCA100521M35

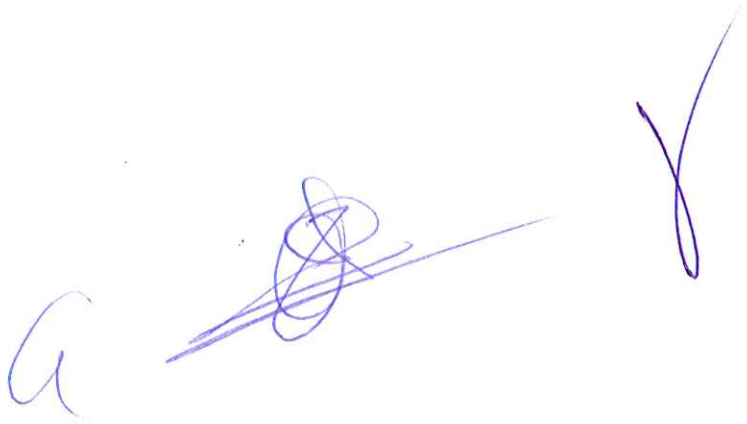
Importe a Transferir:\$1,360,196.68 MN

Número de Referencia:240715

Concepto del Pago:OP 308 FACT A3.A4 O.0013 ANT. RED DRENAJ

Fecha de Aplicación:24/Jul/2015

Clave de Rastreo:8846CAP3201507240263195828

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a large, circular flourish and a long horizontal stroke extending to the right.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No DE OBRA: 2015301930013
CONTRATO: DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
FONDO FISM-DF-CONAGUA

OBRA:

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA
CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A".

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Acumulados Anteriores	Descripción	Importe Total	% 0.00	% 0.00	DEL		HOJA 1
						24/07/2015	01/08/2015	
						31/07/2015	31/08/2015	

OBRA No. 2015 30 193 0013 PRELIMINARES

R33-2000		TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE : AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES. RUPTURA MECANICA EN PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y DEMAS CARGOS CORRESPONDIENTES.	\$ 15,222.40	0.39%		\$ 15,222.40		
RDEM-PAV01A		LEVANTAR ESCORIA EXISTENTE CON RECUPERACION, CON EQUIPO MECANICO, DE 10 CM DE ESP. PROMEDIO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A 2 KM PARA ALMACENAJE TENDIDO Y COPACTACION DE MATERIAL TIPO 2 (ESCORIA) CON EQUIPO MECANICO A 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: NIVELACION, CARGA, ACARREOS 2 KM DE DISTANCIA, TENDIDO Y COPACTACION AL 98%.	\$ 8,200.03	0.21%		\$ 8,200.03		
ESCORIA 01		TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y NIVELES. INCL. CRUCETAS, ESTACAS, HILOS Y MARCAS CON CALHIDRA.	\$ 88,957.12	2.28%		\$ 88,957.12		
ESCORIA 02			\$ 120,685.44	3.09%				\$ 120,685.44
TRA-001			\$ 10,178.78	0.26%		\$ 4,126.53	\$ 6,052.25	
			\$ 243,243.77	6.23%		40.54%	59.46%	
			\$ 243,243.77	% 6.23		\$ 116,506.08	\$ 6,052.25	\$ 120,685.44

PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA S.A DE C.V

C. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No DE OBRA: 2015301930013

CONTRATO: DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15

FONDO FISM-DF-CONAGUA

OBRA:

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A".

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	DEL		AL		HOJA 2
				24/07/2015	01/08/2015	31/07/2015	21/09/2015	
EXC-001	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE CIMENTACION EN TERRENO TIPO " I " DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO DE CEPA.		\$ 57,301.30					
				\$ 39,069.07	\$ 18,232.23			
				68.18%	31.82%			
R33-2026	EXCAVACION CON EQUIPO MECÁNICO EN ZANIAS DE MATERIAL " A " Y/O " B " DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B (ZONA URBANA, CON SERVICIOS). INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES.		\$ 192,865.04					
					\$ 192,864.63			\$ 0.41
					100.00%			0.00%
R33-2027	EXCAVACION CON EQUIPO MECÁNICO EN ZANIAS DE MATERIAL " A " Y/O " B " DE 2.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; ZONA B. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES.		\$ 27,030.56					
				\$ 6,524.62	\$ 20,505.94			
				24.14%	75.86%			
PLA-015A1	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR, EN ZANIAS CON MATERIAL LIMPIO DE BANCO, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.		\$ 58,763.77					
				\$ 8,963.96	\$ 49,799.75			\$ 0.06
				15.25%	84.75%			0.00%
ACOS-15A	ACOSTILLADO MANUAL CON PISON DE MANO COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION INCLUYE: INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.		\$ 39,079.32					
				\$ 4,799.21	\$ 34,280.06			\$ 0.05
				12.28%	87.72%			0.00%

\$ 375,039.99	% 9.59	\$ 59,356.86	\$ 315,682.61
---------------	--------	--------------	---------------

PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA S.A DE C.V

C. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nº DE OBRA: 2015301930013
CONTRATO: DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
FONDO FISM-DF-CONAGUA

OBRA:

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA
CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A".

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 15.82	%	DEL		AL		HOJA 3
						24/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	
TPVC-200 DPE	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CON DOBLE PARED ESTRUCTURADA ULTRA R46 PSI 8", INTERIOR LISO, CON CAMPANA INTEGRADA Y JUNTA DE HULE HERMETICA , INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES EN OBRA, CORRESPONDIENTES CONSUMIBLES Y DEMAS CARGOS		\$ 618,283.76		9.25%					
			\$ 361,572.66				\$ 43,638.08	\$ 311,700.57	\$ 6,234.01	
							12.07%	86.21%	1.72%	
RELL-002AA	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM., DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.		\$ 428,815.08	10.97%			\$ 50,028.43	\$ 357,345.90	\$ 21,440.75	
							11.67%	83.33%	5.00%	
CYA1ER	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y ACARREO A 1ER KM. INCLUYE ABUNDAMIENTO		\$ 17,390.98	0.44%			\$ 13,377.68	76.92%	\$ 4,013.30	
									23.08%	
CYA027	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO.		\$ 27,238.08	0.70%			\$ 20,952.37	76.92%	\$ 6,285.71	
									23.08%	

Acumulados	\$ 835,016.80	% 21.36	\$ 93,666.51	\$ 703,376.51	\$ 37,973.78
------------	---------------	---------	--------------	---------------	--------------

PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA S.A DE C.V

C. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No DE OBRA: 2015301930013
 CONTRATO: DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
 FONDO FISM-DF-CONAGUA

OBRA:

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA
 CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A".

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL	24/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	21/09/2015	HOJA 4

ADCMCR-01
 ADEME DE MADERA CERRADO, A BASE DE MADERA
 DE PINO DE 2DA INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO
 DE MATERIALES, INSTALACION Y RETIRO AL
 TERMINO DE LA OBRA, EL MATERIAL SEGUIRA
 SIENDO DEL CONTRATISTA

\$ 1,453,300.56
 \$ 516,975.37
 13.23%

\$ 94,954.66
 18.37%
 \$ 422,020.71
 81.63%

ALBAÑILERIA

PVIS-1.75 20 A POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A
 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE
 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 1.75 MT. DE
 PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE
 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON
 MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO
 INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO
 ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR,
 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE
 ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON
 LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA
 CON VAR'S DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS
 SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.

\$ 79,585.77
 2.04%
 \$ 14,470.14
 18.18%
 \$ 65,115.63
 81.82%

Acumulados	\$ 596,561.14	% 15.27	\$ 94,954.66	\$ 436,490.85	\$ 65,115.63
------------	---------------	---------	--------------	---------------	--------------

PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA S.A DE C.V

C. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No DE OBRA: 2015301930013
 CONTRATO: DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
 FONDO FISM-DF-CONAGUA

OBRA:

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A".

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 52.45	%	DEL	AL	01/08/2015	01/09/2015	21/09/2015	HOJA 5

PVIS-2.00 20 A POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.

PVIS-2.50 20 A POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2.50 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.

\$ 71,168.40 1.82% \$ 65,237.70 91.67% \$ 5,930.70 8.33%

\$ 9,293.07 0.24% \$ 9,293.07 100.00%

Acumulados	\$ 80,461.47	% 2.06	\$ 74,530.77	\$ 5,930.70
------------	--------------	--------	--------------	-------------

PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA S.A DE C.V

C. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No DE OBRA: 2015301930013
 CONTRATO: DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
 FONDO FISM-DF-CONAGUA

OBRA:

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA
 CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A".

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL	24/07/2015	31/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	21/09/2015	HOJA 6

PVIS-2.75 20 A POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA 2.75 MT. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS

\$ 9,992.48
 100.00%

PVIS-3.00 20 A POZO DE VISITA TIPO COMUN DIÁMETRO DE 0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERÍA CON JUNTA HERMÉTICA DE 20 CMS. DE DIÁMETRO, HASTA TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR. IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No.6, ACADA 40 CM DE DISTANCIA, CON LOSA DE FONDO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR ARMADA CON VAR'S. DEL No. 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y CONCRETO F'c = 200 KG/CM2.

\$ 10,718.90
 100.00%

Acumulados	\$ 20,711.38	% 0.53	\$ 20,711.38
------------	--------------	--------	--------------

PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA S.A DE C.V

C. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS

Nº DE OBRA: 2015301930013
CONTRATO: DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
FONDO FISM-DF-CONAGUA

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A".

	Acumulados Anteriores	\$ 2,151,034.55	% 55.04	DEL AL	24/07/2015 31/07/2015	01/08/2015 31/08/2015	01/09/2015 21/09/2015	
								HOJA 7

Clave	Acumulados Anteriores	\$ 2,151,034.55	% 55.04
	Descripción	Importe Total	%
PVIS-3.50 20 A	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DIAMETRO DE0.60 A	\$ 12,063.96	0.31%

PVIS-3.50 20 A POZO DE VISITA TIPO COMUN DIAMETRO DE0.60 A 1.20 MTS PARA TUBERIA CON JUNTAHERMÉTICA DE 20 CM DE DIAMETRO HASTA 3.50 MT. DE PROFUNDIDAD.CON MUROS DE TABIQUE ROJO DE 28 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR,EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESPESOR.IMPERMEABILIZANTEINTEGRAL, ESCALONES DE ACERO DEL No. 6, A CADA 40 CM DE DISTANCIA CON LOSA DE FONDO DE 0.15 M DE ESPESOR ARMADA CON VRS, DEL No. 3 @20CM EN AMBOS SENTIDOS

CONEX-001

\$ 6,744.81 0.17%

0.17%

\$ 6,744.81
100.00%

BROCA-ESP

\$ 88,461.36	2.26%
--------------	-------

2.26%

\$ 26,191.57	\$ 62,269.79
29.61%	70.39%

PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA S.A DE C.V	Acumulados	\$ 107,270.13	% 2.74	\$ 38,255.53	\$ 69,014.60
C A I M A T E R E S A C A R C I A C A M P E R A N I S					

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No DE OBRA: 2015301930013
 CONTRATO: DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15
 FONDO FISM-DF-CONAGUA

OBRA:

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA
 CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A".

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCIÓN	Acumulados Anteriores	Importe Total	% 57.78	% 16.05%	DEL		AL		HOJA 8
						24/07/2015	01/08/2015	31/07/2015	21/09/2015	

DESC-6.00ADPE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA
 DESCARGA DOMICILIARIA HASTA 6.00 M DE
 LONGITUD A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 15 CM
 DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DOBLE
 PARED ESTRUCTURADA CON JUNTA DE HULE
 HERMETICA DE 15 CMS. DE DIAMETRO Y PIEZA
 ESPECIAL TEE EN YEE CON JUNTA HERMETICA DE
 20 X 15 CM.INCLUYE: EXCAVACION, SUMINISTRO E
 INSTALACION DE MATERIALES, RELLENO DE
 MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION,FLETES,
 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA,
 ALMACENAMIENTO DE MATERIAL,MANO DE OBRA,
 HERRAMIENTA, EQUIPO Y DEMAS CARGOS
 CORRESPONDIENTES.

\$ 299,408.02 \$ 327,923.20
 47.73% 52.27%

REG-001R REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 A 1.20 MTS.SECCION
 INTERIOR: A BASE DE TABIQUE ROJORECOCIDO DE
 LA REGION JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO
 ARENA 1:3 Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO
 CEMENTO ARENA 1:3.FIRME DE CONCRETO SIMPLE
 FC=150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESP., TAPA DE
 CONCRETO DEFC=150 KG/CM2. ARMADO CON
 MALLALAC 6X6/8-8. MARCO DE ANGULO
 GALVANIZADO DE 1 1/4" " X 1 1/4" X 1/8" Y
 CONTRAMARCO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8". Y
 CONTRAMARCO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X
 1/8" INCLUYE: JALADERA CON REDONDO LISO DE
 3/8" GALVANIZADO, COLOCACION DE DISPARO CON
 TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAMETRO Y 1 M
 DE LARGO, EXCAVACION,RELLENO, ACARREO DE
 MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA Y TODO
 LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

\$ 559,792.96 14.32% \$ 297,033.09 \$ 262,759.87
 53.06% 46.94%

Acumulados	\$ 1,187,124.18	% 30.37	\$ 596,441.11	\$ 590,683.07
PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA S.A DE C.V			C. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nº DE OBRA: 2015301930013

CONTRATO: DOP-FISM-DF-CONAGUA-013/15

FONDO FISM-DF-CONAGUA

OBRA:

INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA CABALLERIZAS (SECTOR NORTE), SUBSECTOR "A".

PROGRAMA DE MONTOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Acumulados Anteriores	Importe Total	%	DEL	AL	24/07/2015	01/08/2015	31/08/2015	01/09/2015	21/09/2015	HOJA 9

OMA-DOM-2004) REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA CONTUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2" DE DIAM.CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 4 MTS.INCLUYE: EXCAVACION HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD 1.5 M PROFUNDIDAD ,RELLENO, EQUIPO DE SOLDAR, CONECTORES,MISCELANEOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

\$ 274,400.04
100.00%

BACHEO ASFALTICO

BASE 15 11/2" AIL; SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION MANUALMENTE EN AREAS PEQUEÑAS, DE BASE HIDRAULICA CON AGREGADO PETREO 11/2" A FINOS DE 15 CMS ESPESOR, INCLUYE:NIVELACION, ACARREOS, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90 %. RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DEROMPIMIENTO RAPIDO (E.C.R.R.) A RAZON DE0.5 LTS/M2.

\$ 40,030.46
100.00%

PAV-BACHEO BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, COMPACTO CON MATERIALTRITURADO T.M.A. 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN PROP. DE 130 KG/M3.ELABORADO EN PLANTA, INCLUYE:ADQUISICION, COMPACTACION AL 95%BARRIDO DE LA SUPERFICIE, TENDIDO YACARREOS

\$ 9,679.35
100.00%

LIM005A-1 LIMPIEZA TOTAL Y PERMANENTE DE OBRA ABASE DE PALA Y BARRIDO.

\$ 133,763.14
100.00%

\$ 5,309.30
100.00%

Acumulados	\$ 463,182.29	% 11.85	\$ 274,400.04	\$ 188,782.25
------------	---------------	---------	---------------	---------------

ACUMULADO TOTAL \$ 3,908,611.15 % 100.00

PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALGARCA S.A DE C.V

C. ALMA TERESA GARCIA CAMBRANIS
